

Verslag aangaande huishoudelijke installatie op lage en zeer lage spanning (boek 1 KB 08/09/2019)



De installatie is conform met boek 1 van het KB van 08/09/2019.

Inlichtingen

Naam en voornaam eigenaar	: Ajiou Mourad	Adres eigenaar	: Sinttruiderssteenweg 274, 3500 Hasselt
Opdrachtgever	: /	Datum van onderzoek	: 27-02-2026
Installateur	: Ajiou Mourad	BTW installateur	: /
Distributiebeheerder	: Fluvius Limburg	Agent-bezoeker	: D.W
Plaats van onderzoek	: Sinttruiderssteenweg 274 3500 Hasselt		

Identificatie van de installatie

Type lokaal	: Wooneenheid - Huis	Teller nr	: 1SAG3100302186
EAN	: 541449206005623227	Nom. Spanning (V)	: 3N400 V
Max stroom (A)	: 20 A/kVA	Aard van de stromen	: AC
Type alg. schakelaar	: Vermogenschakelaar		
Type aardverbindingssysteem	: TT		
Voedingskabel (hoofd)bord	: Type: XVB - Sectie L: 10 mm ² - N: 10 mm ² - PE: 16 mm ²		
Voedingsbron	: Openbare distributienet		
Decentrale LS productie-eenheid	: Afwezig		

Gegevens van de uitgevoerde controle

Bestaand verslag aanwezig	Herkeuring BTQ-verslag Nr: 19301 Datum: 17-04-2024	
Type bezoek	Gelijkvormigheidscontrole (Hfst 6.4), Ingebruikname (6.4.7.1.)	
Uitvoeringsdatum* *volgens verkregen informatie	Van 01.06.2020 tot 01.06.2023	
Afwijkende bepalingen	Niet toegepast	
Bijzondere installaties en/of ruimten	Ruimten die een bad en/of douche bevatten (7.1)	Voor 01/03/2025

Schema's, plannen en documenten

Stroombaanschema's Nr: Maurad Datum: 2026-02-27	: Aanwezig - Overeenstemming: Conform
Situatieplan Nr: Maurad Datum: 2026-02-27	: Aanwezig - Overeenstemming: Conform
Voorwerp van uitgevoerde controle	: zie ontvangen schema's en/of plannen
Aantal verdeelborden	: 1
Aantal (eind)stroombanen	: 31
N° reserve stroombanen	: Geen
Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten	: Niet van toepassing
Plan van veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing
Lijst met veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing

Controles, beproevingen en metingen

Differentieelstroombeschermingsinrichtingen (DSI)	: Aanwezig
Continuïteit beschermingsgeleiders	: Conform
Continuïteit equipotentiaalverbindingen	: Hoofdequipotentiaal : Conform - Bijkomende equipotentiaal verbinding : Conform
Bescherming indirect contact	: Voldoende
Staat vast (opgesteld/geïnstalleerd) materieel	: Conform
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	: Conform
Visuele controle van verplaatsbaar materieel	: Conform
Elektrisch materieel i.f.v. uitwendige invloeden	: Conform
Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	: Voldoende
Beveiligingen in overeenstemming met de doorsnede geleiders, toestellen en materieel	: Conform
Beveiligingen tegen overstroom	: Conform
Bescherming tegen thermische invloeden	: Conform
Type aardelektrode	: Aardingspennen

Metingen

Meetapparatuur waarvan de agent-bezoeker titularis is

Spreidingsweerstand i.o.m. DSI	: Conform - 16.8 Ohm
Algemeen isolatieniveau	: Conform - 11,3 MOhm

De isolatiemeting werd niet uitgevoerd op de meet- en regeltechnische installaties, de ZLS installaties en DC-kringen van fotovoltaïsche installaties.

Besluit

De elektrische installatie (die deel uitmaakte van onze controle) voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen en/of nota's. Het/de ééndraadsschema('s) en het situatieplan(nen) zijn getekend voor gezien. De algemene differentieelbescherming(en) is (zijn) verzegeld.

De installatie moet nagezien worden uiterlijk 17-04-2049 alsook alvorens indienstelling na modificatie of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

Raadgevingen voor huishoudelijke installaties

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie ;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden ;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit ;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



D.W.

De agent-bezoeker

Inbreuken en/of opmerkingen en/of nota's

Inbreuken Lijst

Geen

Opmerkingen Lijst

- De klant deelde ons mee dat er geen veiligheids- en/of kritische installaties aanwezig zijn
- De klant deelde ons mee dat de elektrische installatie geen evacuatiewegen doorkruist en/of geen moeilijke evacueerbare ruimten bevat
- Alleen de inbreuken en/of opmerkingen van het vorig verslag werden nagezien.
- Het voorwerp van onze controle beperkt zicht tot de aangeduide delen van de installatie opgenomen in het verslag en/of de plannen en/of nota's en/of in bijlagen.
- De visuele controle beperkt zich tot de gemakkelijke zichtbare en bereikbare delen. De verborgen delen zoals delen in valse plafonds, in holle wanden, in putten enzovoort zijn uitgesloten van onze controle.
- De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit verslag is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de controle.
- De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na onze controle opnieuw functioneel is als voor onze keuring

Nota's Lijst

Geen

Oplijsting DSI

Ith (A)	40	I²t	22,5kA²s -3000A
IΔn (mA)	300	Type	A
Algemeen of Bijkomend	Algemeen <=300mA	Verzegeld?	JA
Testknop	OK	Controle foutlus en aansluiting	OK

Oplijsting DSI

Ith (A)	40	I²t	22,5kA²s -3000A
IΔn (mA)	30	Type	A
Algemeen of Bijkomend	Bijkomend <=30mA	Max 8 eindstroombanen?	OK
Testknop	OK	Controle foutlus en aansluiting	OK

Oplijsting DSI

Ith (A)	40	I²t	22,5kA²s -3000A
IΔn (mA)	30	Type	A
Algemeen of Bijkomend	Bijkomend <=30mA	Max 8 eindstroombanen?	OK
Testknop	OK	Controle foutlus en aansluiting	OK

Foto's-1

RI




RA



Foto's-2



Bijlages-1

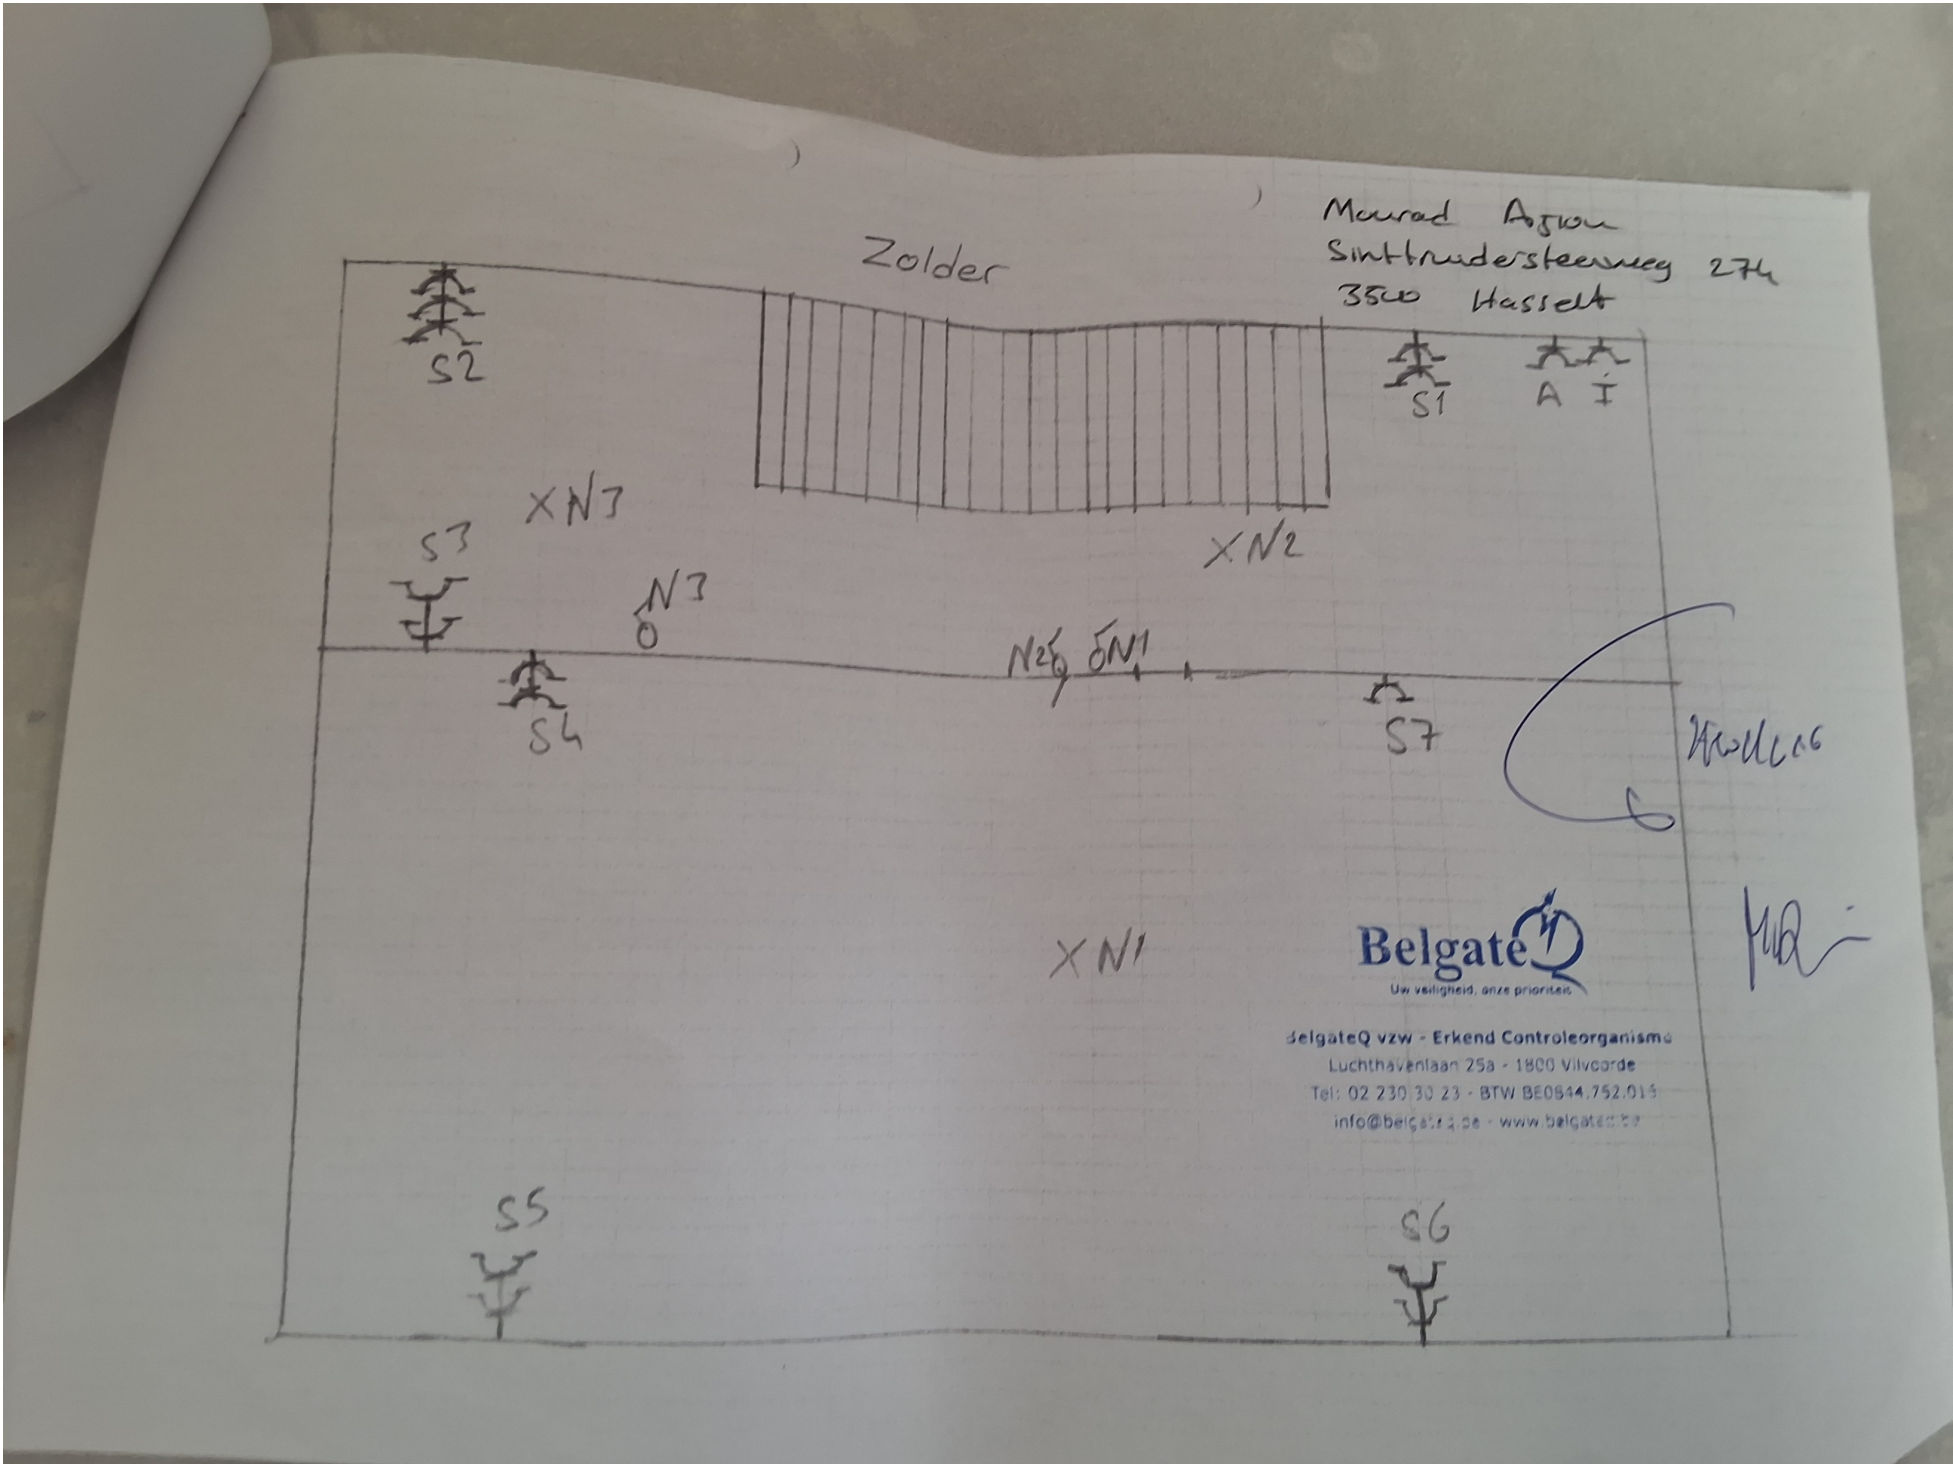

2 de Verdieping

Maurab Agion
Sint-Hederssteennweg 27A
3520 Hasselt

XNH

K1

K2

Xw

SLP 2

K3

K4

K5w

K6

K7

AB7

XCD2

SLP 4

ABS

AB6

AB2

AB1

CD1

CD2

Belgate


Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorg. 1. smd
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0344 751 554
E: info@belgateq.be - W: www.belgateq.be


2/12/2011

Handwritten signature


Bijlages-3

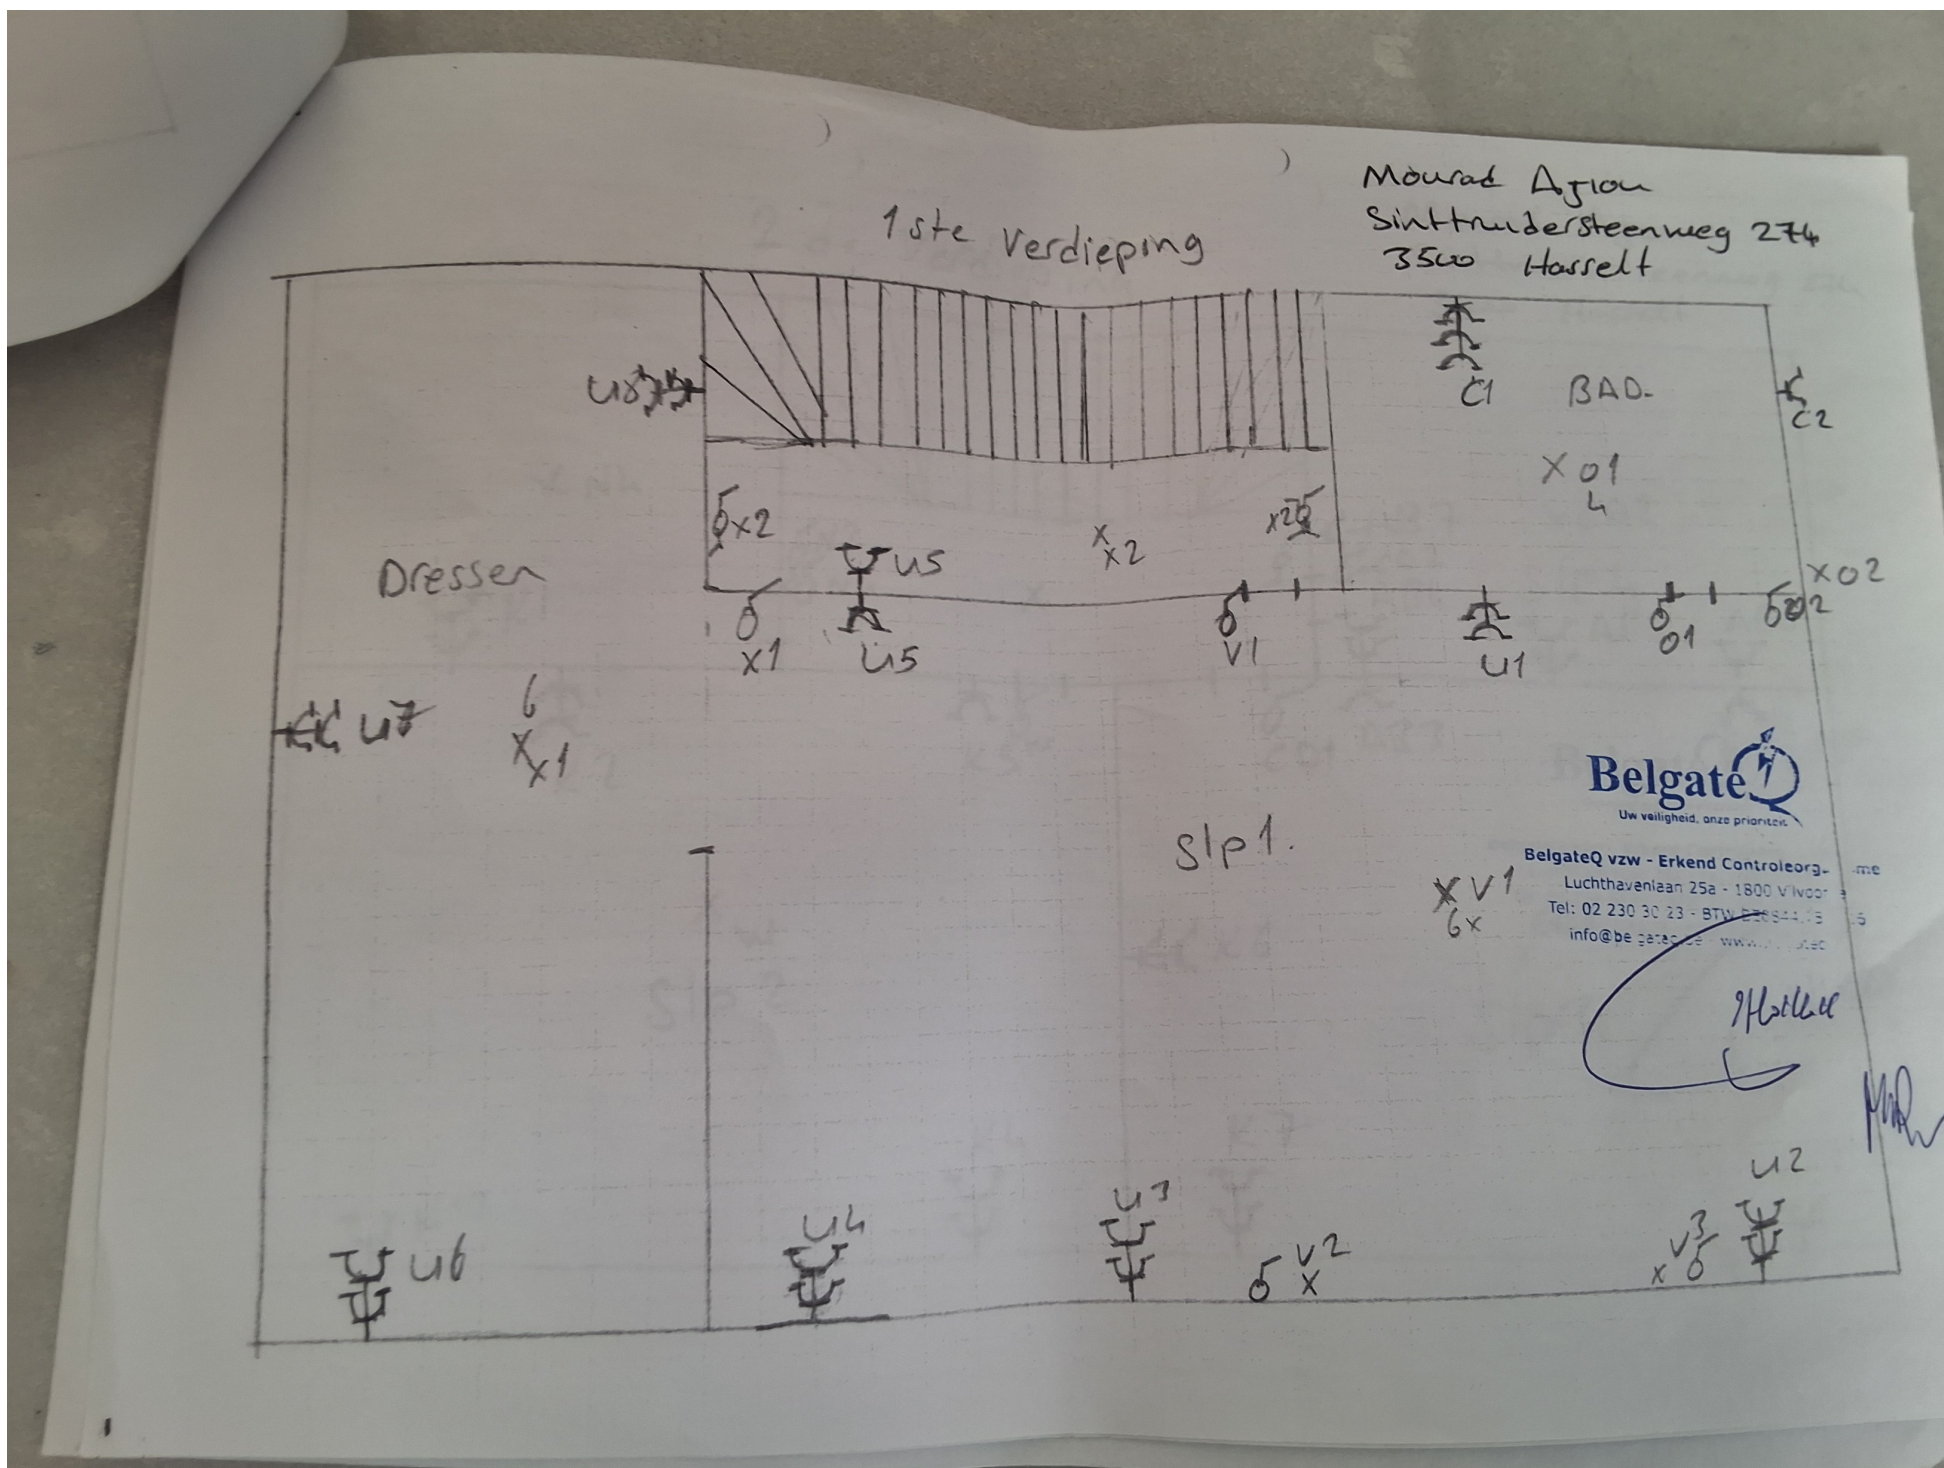

Bijlages-4

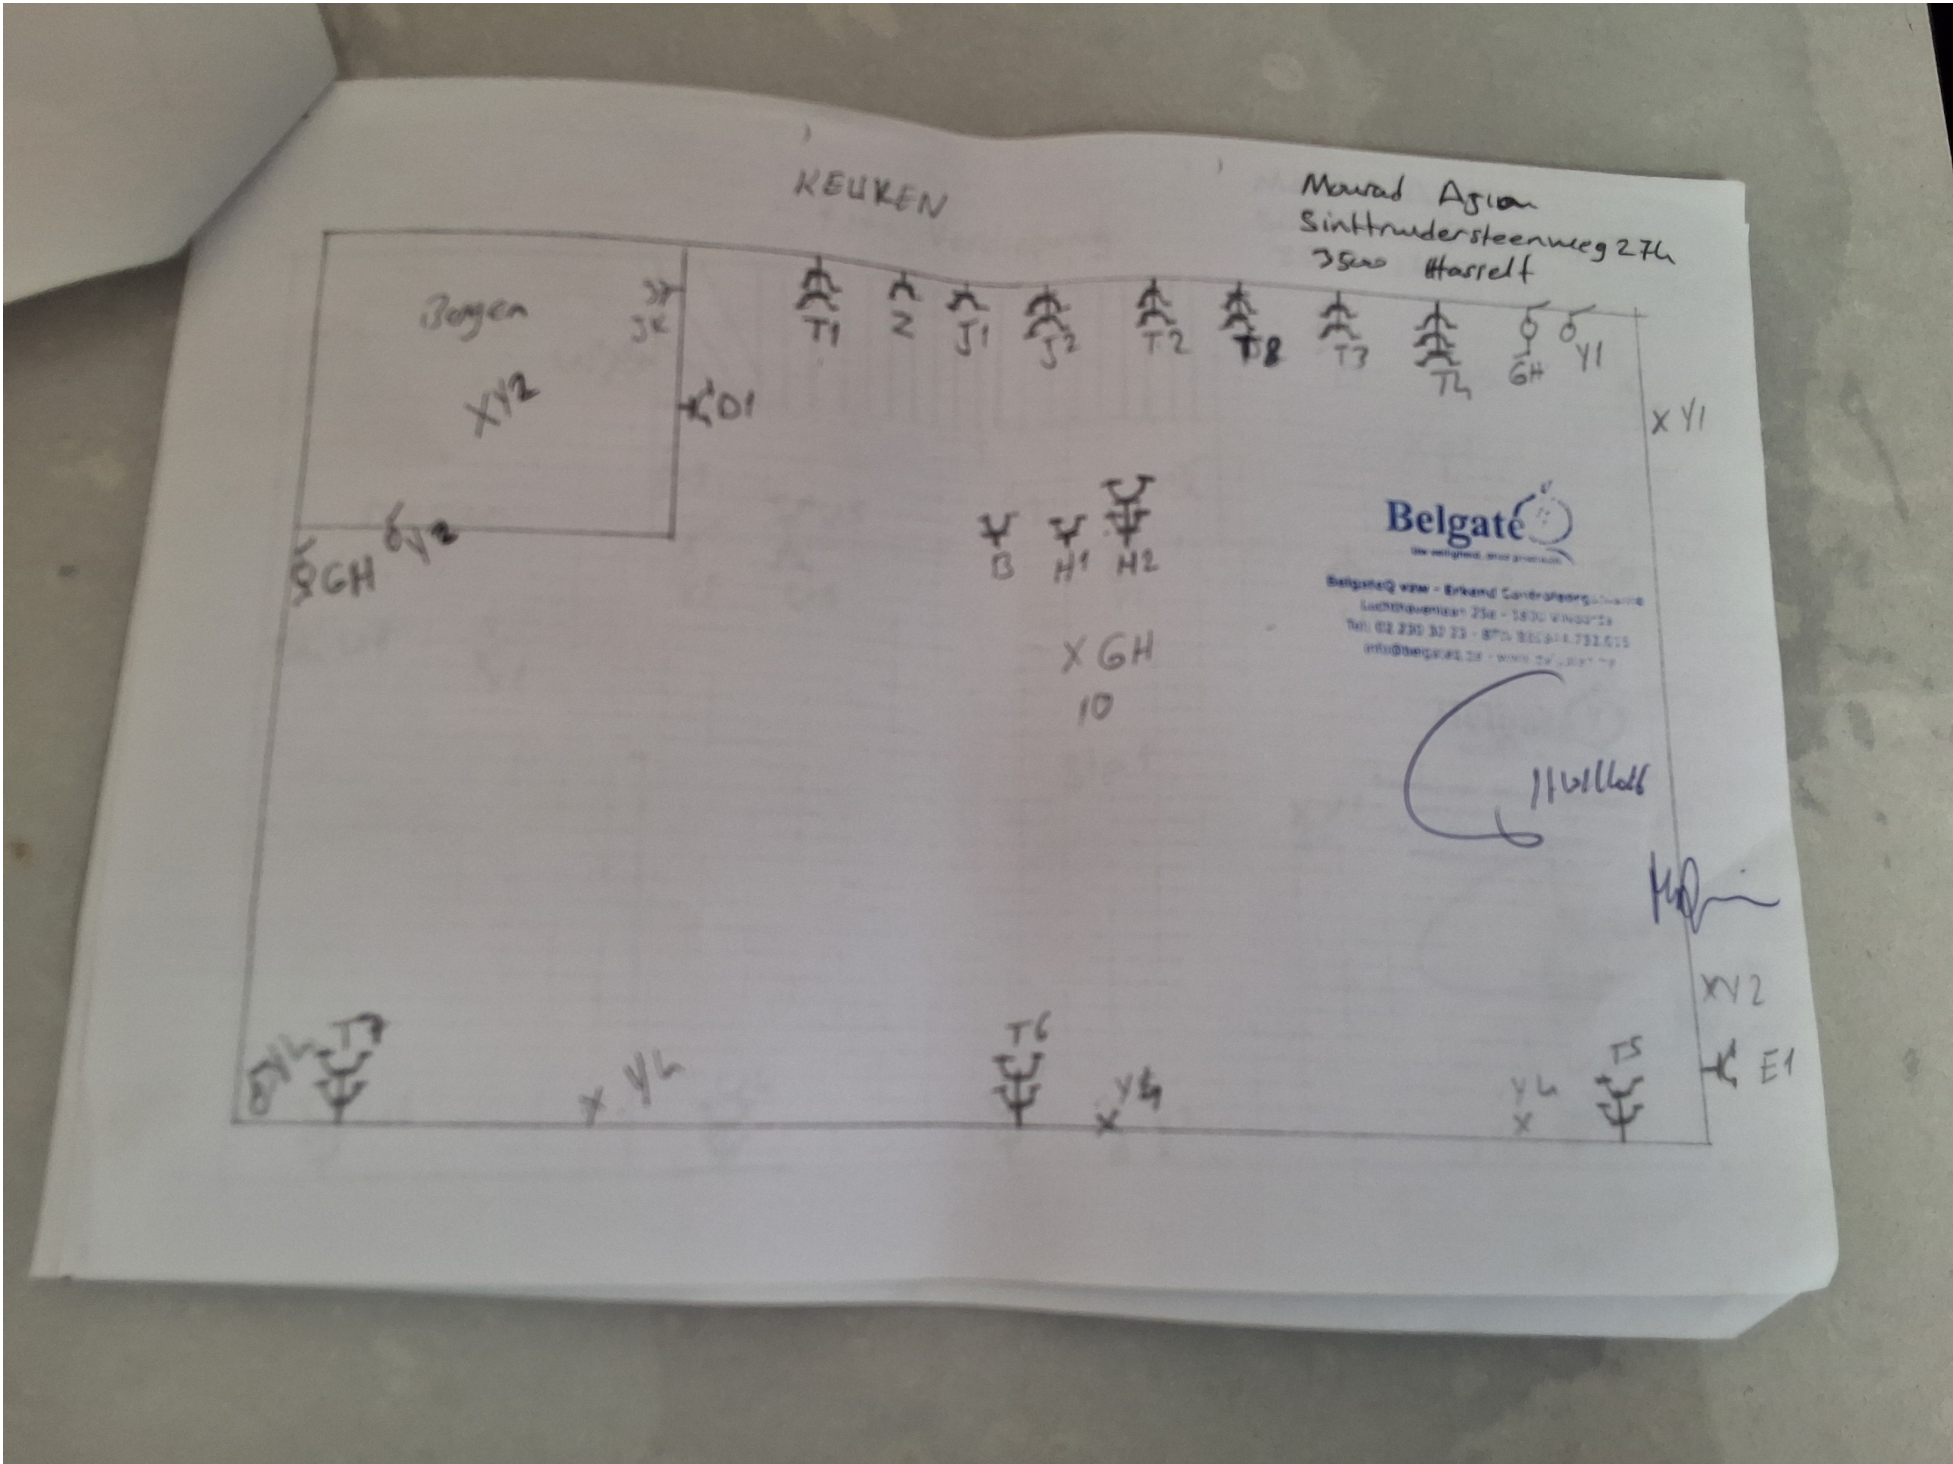

Bijlages-5

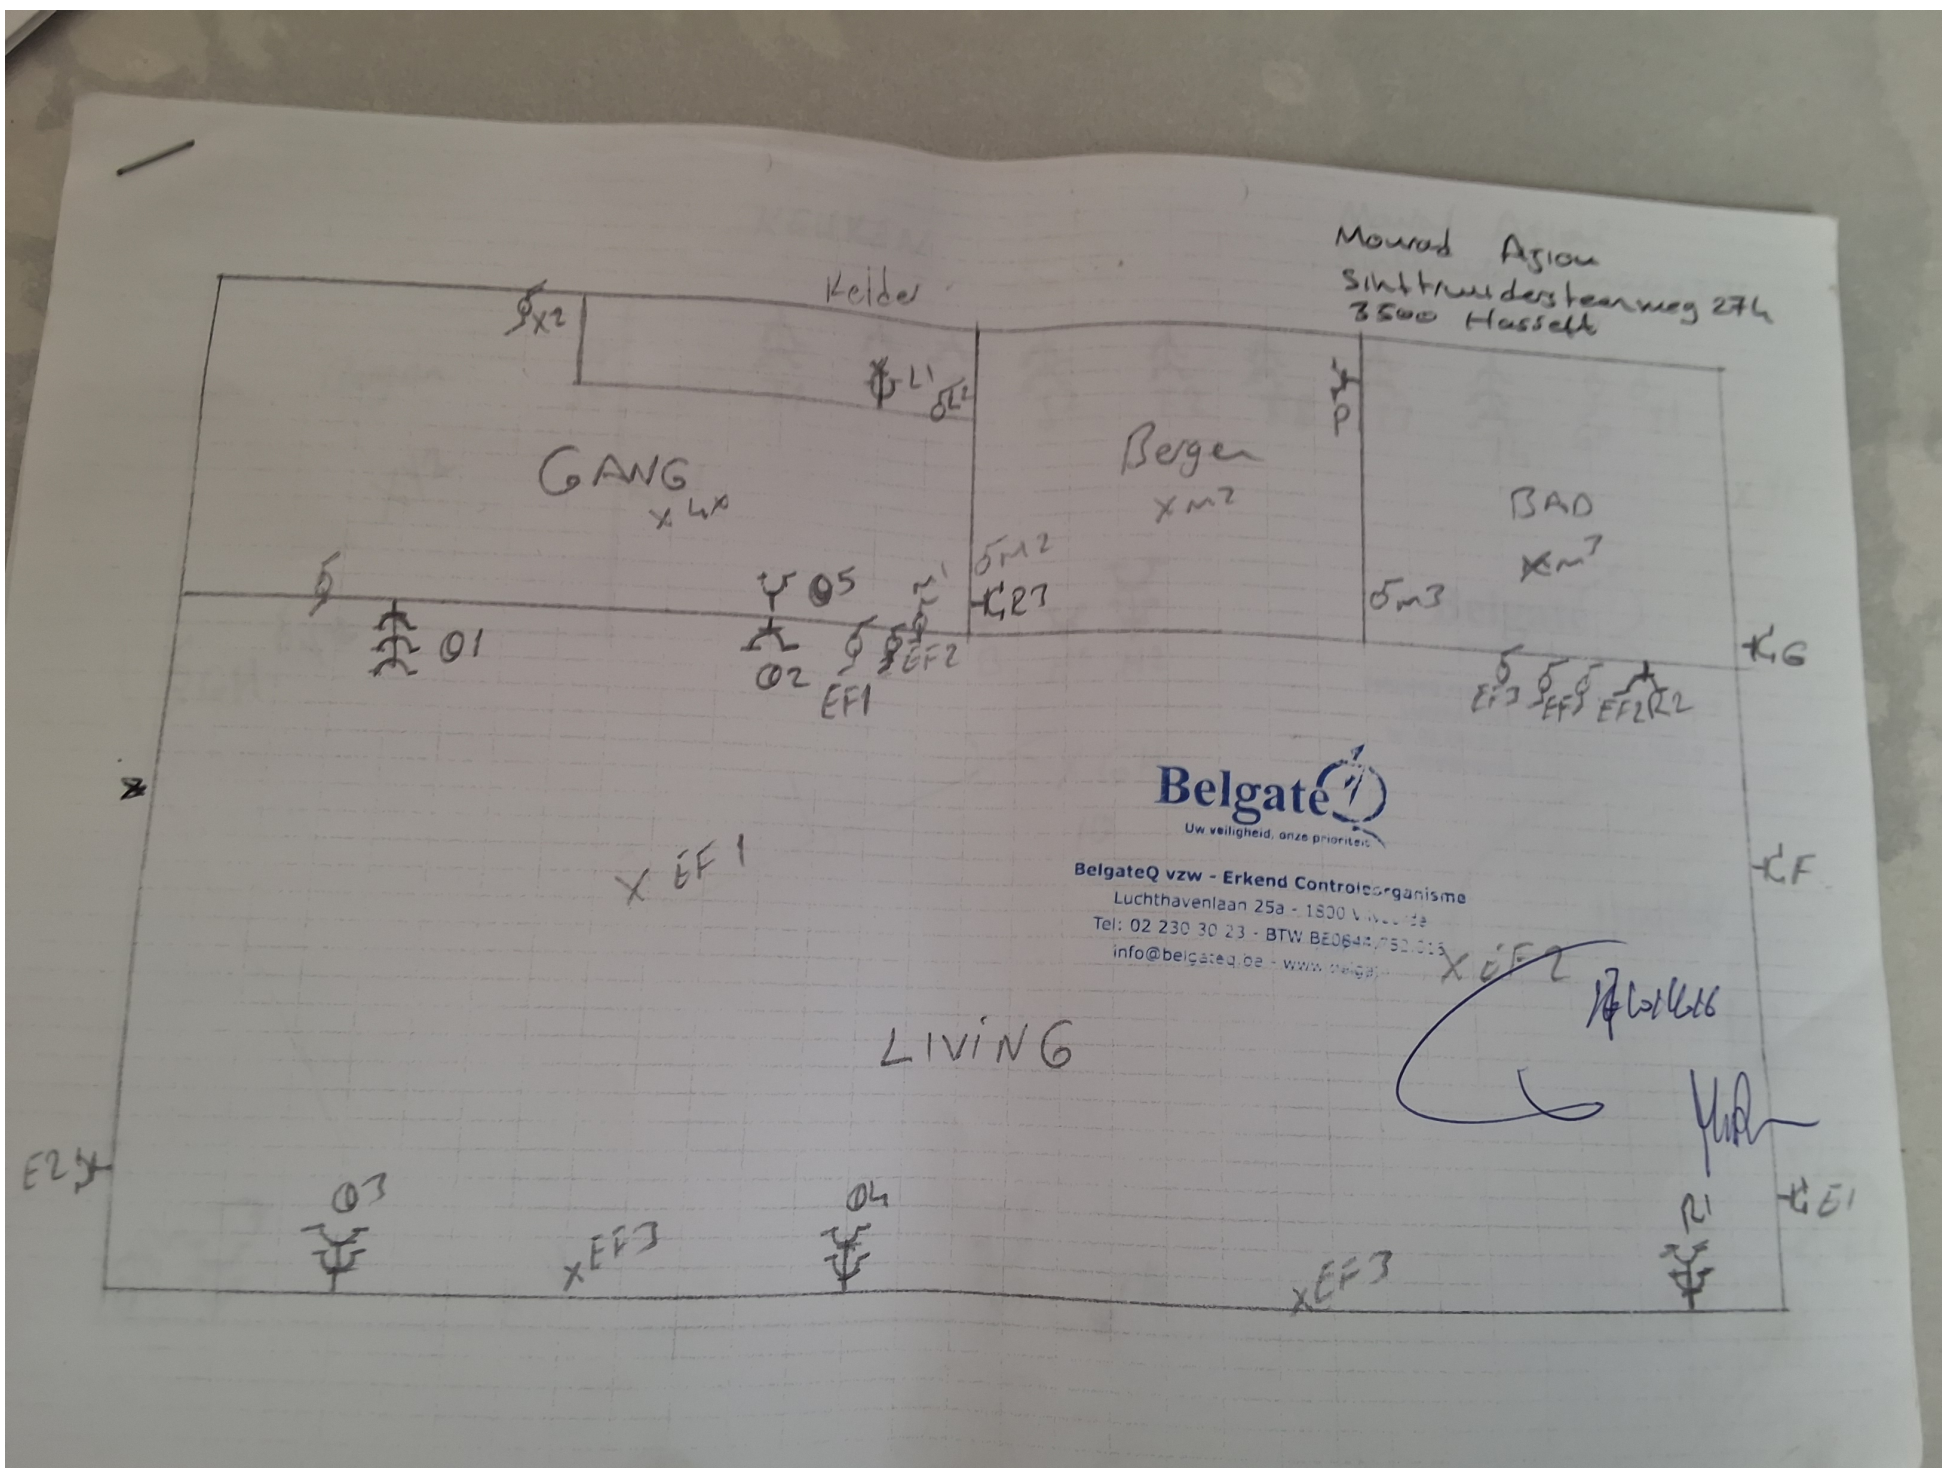

Bijlages-6

- wasmachine - vaatwas

- Bad 1
- Plafond

- Frigo
- Microgolf

- Buiten

- Pomp

- Tuinhuis

- Eiland

Mawad Aglou
Sinttrudesterweg 27h
3500 Hasselt


BelgateQ
Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0944.752.015
info@belgateq.be - www.belgateq.be

Rij

17/06/16

[Handwritten signature]

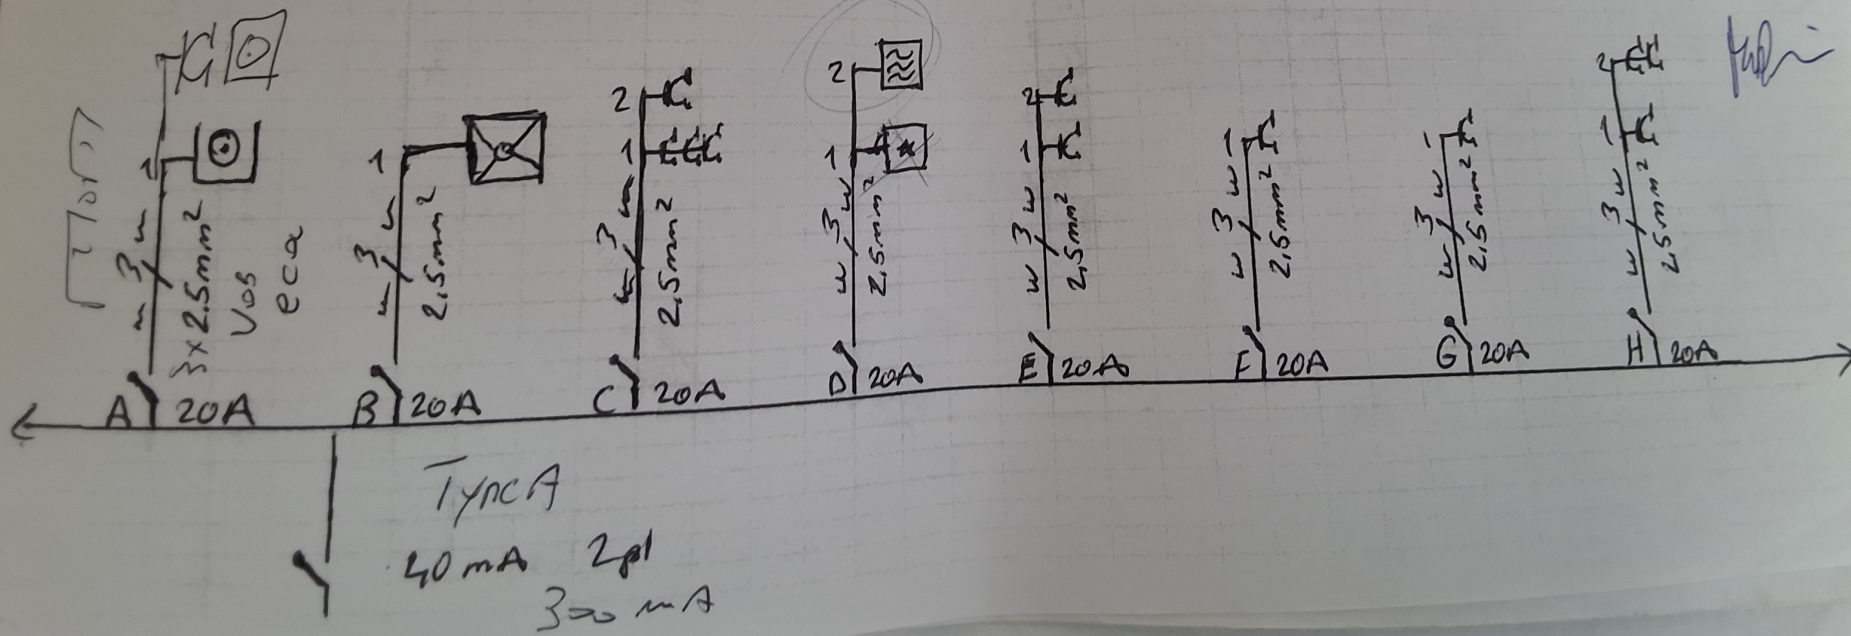

Bijlages-7

- Droogkast - Oven

- Bad 3
- Slp 2
- Slp 3

- Kelder
- Kelder

- Gang B.G.
- Bergen 1
- Bad B.G.


- Zolder
- Traphuis
- Bergen zolder
- Bad 3
- Buiten

- Bad 1
- platdak
- Collector


Marat Agion
Simbrudersteenweg 274
3500 Hasselt

BelgateQ
Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.015
info@belgateq.be - www.belgateq.be

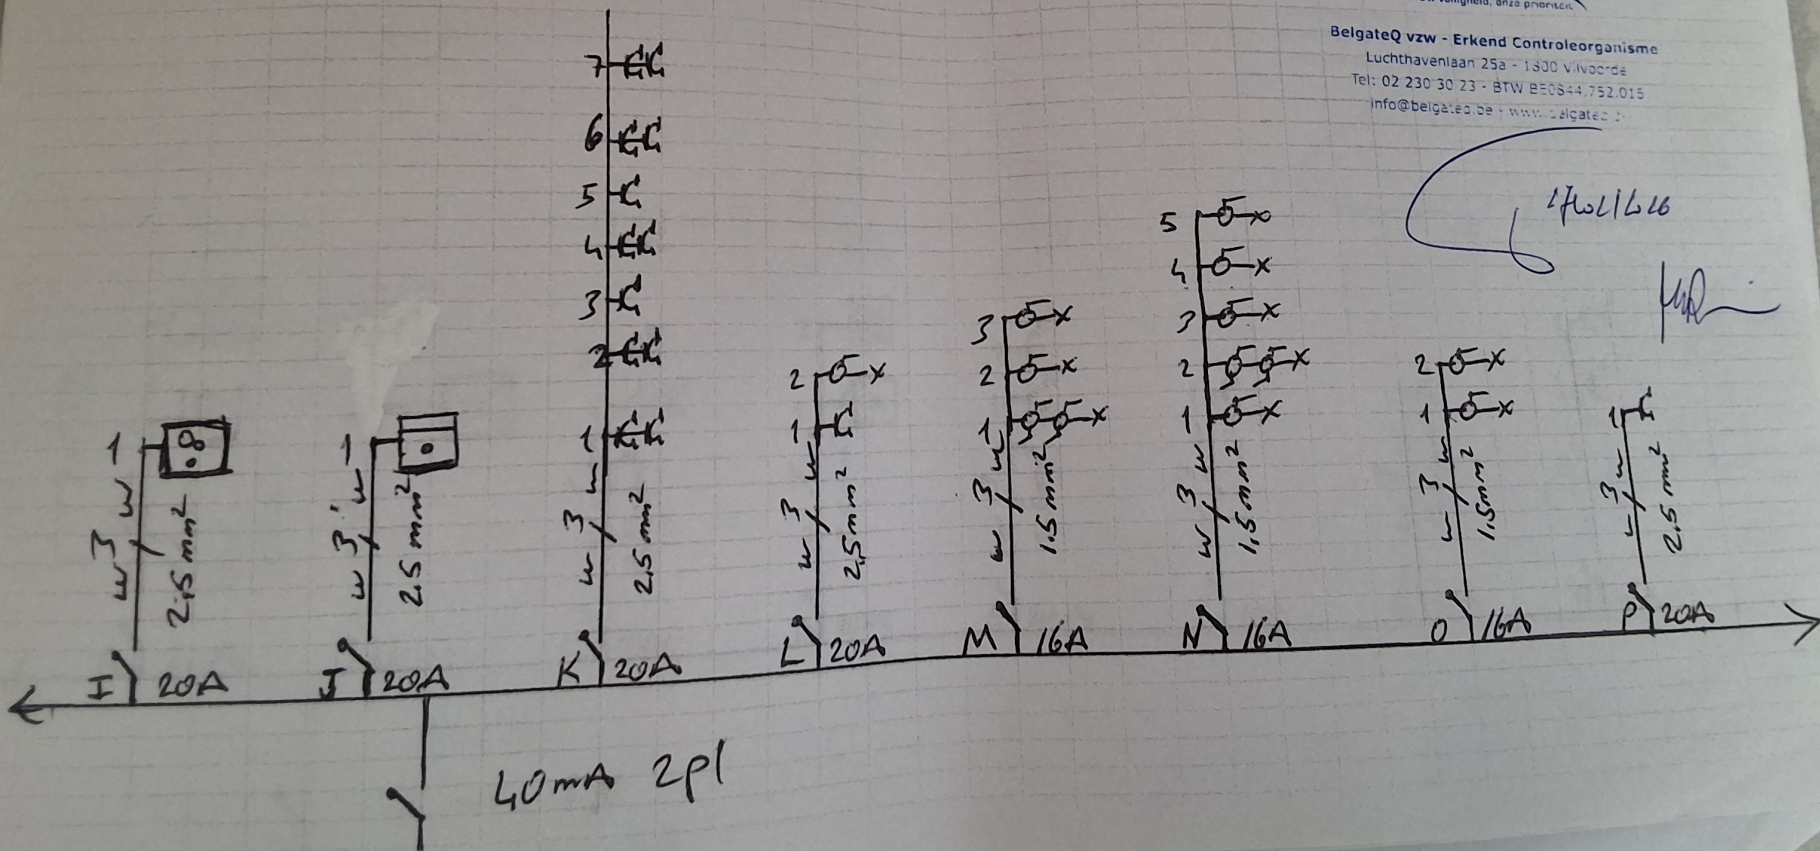

Bijlages-8

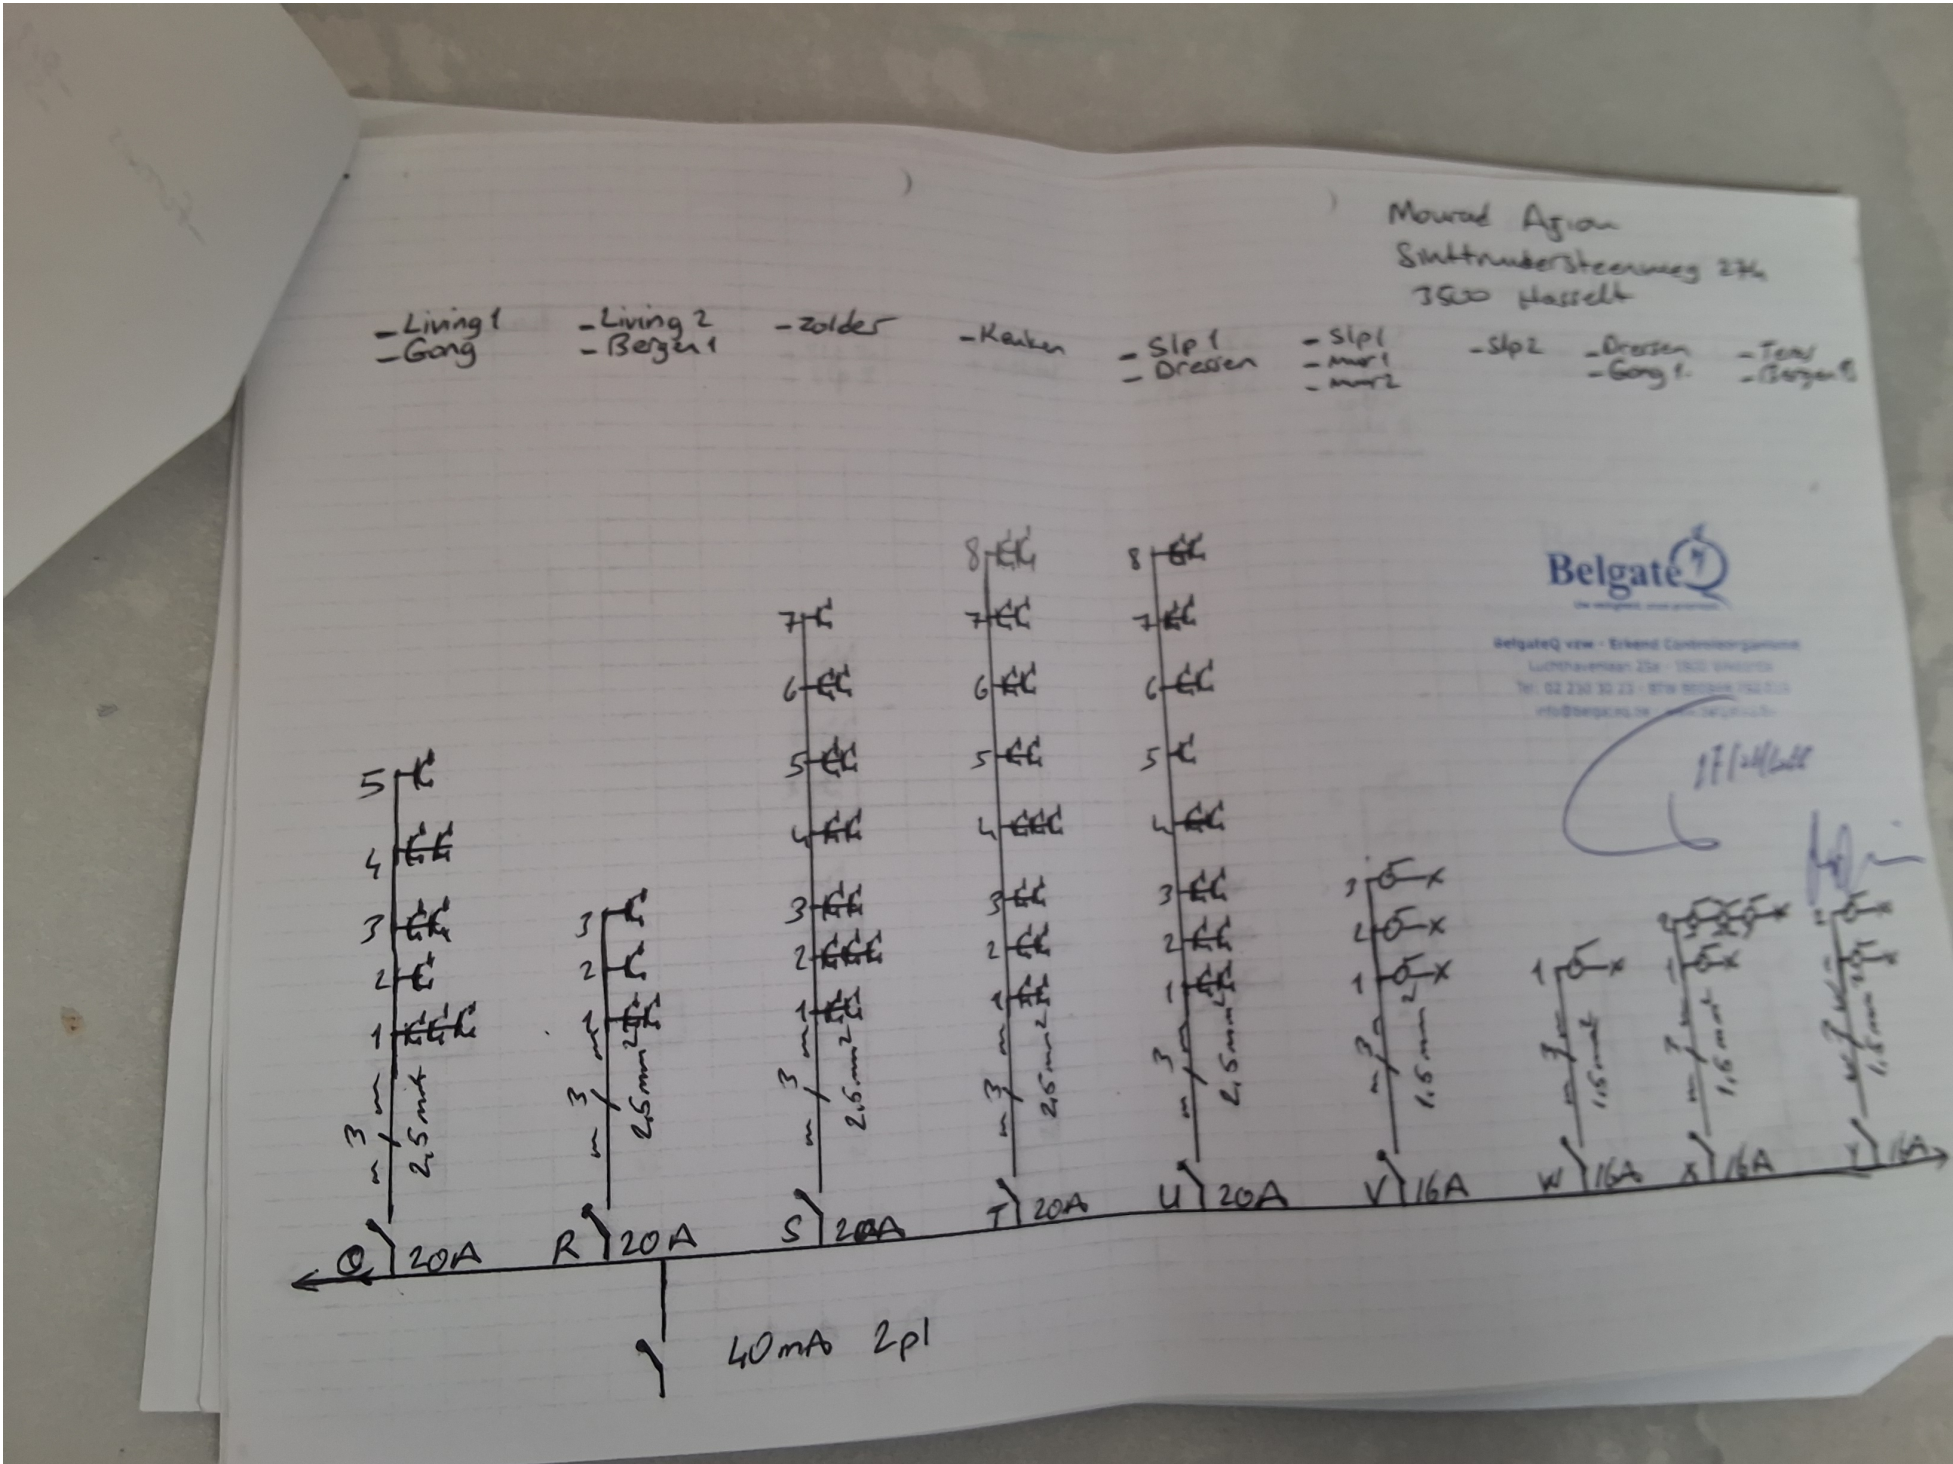

Bijlages-9

